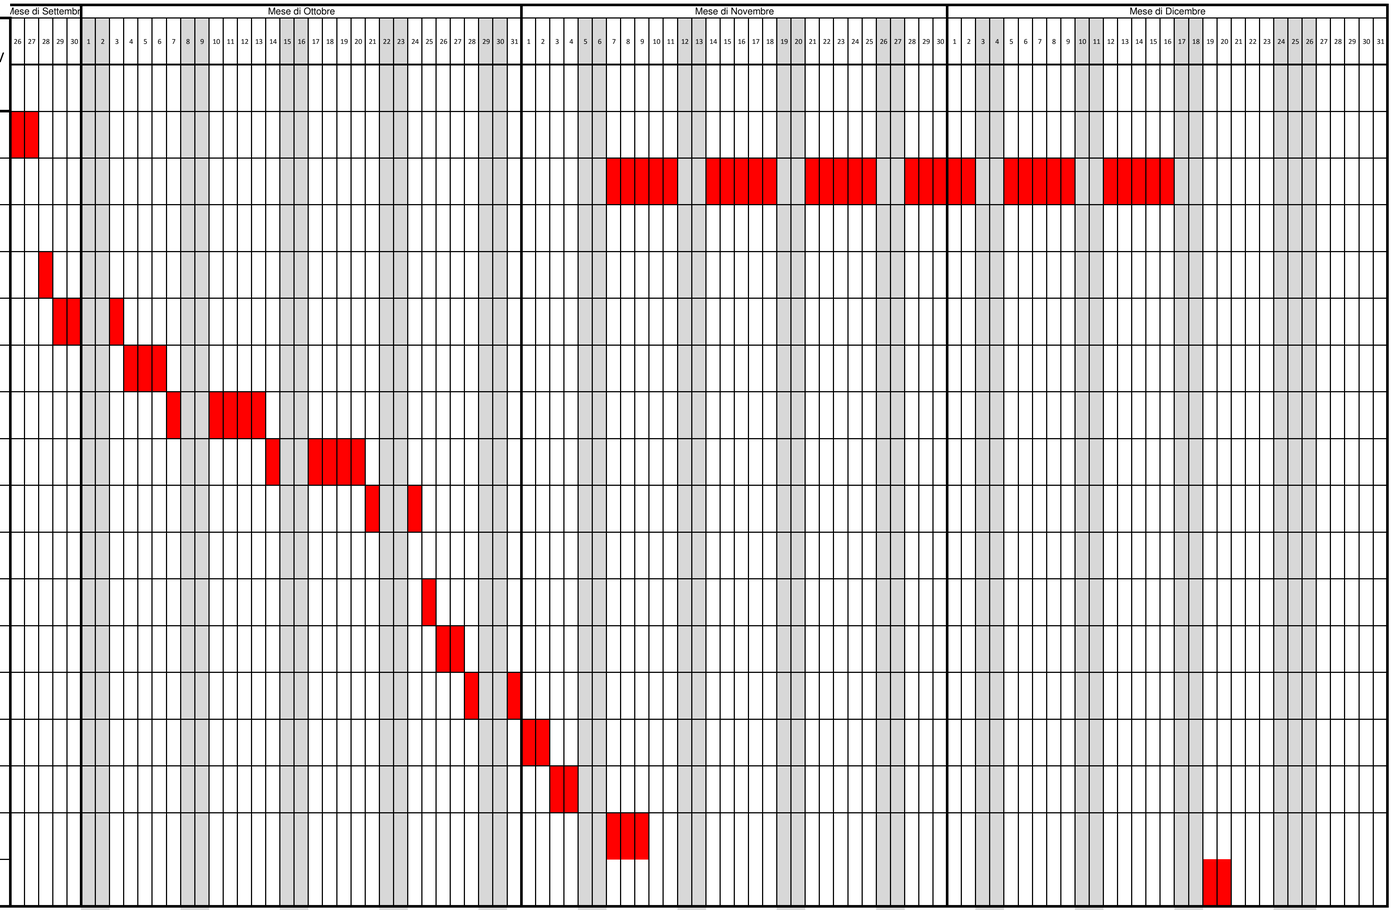Individuazione della soglia massima d'incidenza del costo della manodopera	Durata	Ore/ giorno	Operaio comune edile	Operaio qualificato edile	Operaio specializzato edile	Totale uomini	Totale euro	mezzi	uomini / giorno
LAVORAZIONI			29,72	32,84	35,23				
- Opere provvisionali e di carattere generale	2	8	2	0	0	2	€ 951,04	1 Autocarro	4
- Fornitura e posa di blocchi di media pezzatura	30	8		0	2	2	€ 16.910,40	1 Escavatore 1 Pala	60
- Realizzazione canalizzazione in c.c.a.:									
- Scavo	2	8		1		1	€ 525,44	1 Escavatore	2
- Opere provvisionali	3	8	1	1	2	4	€ 3.192,48	1 Autocarro	12
- Getto Magrone	3	3	1			1	€ 267,48	1 Betonpompa	3
- Casseratura e armatura	5	8	3		1	4	€ 4.975,60	1 Autocarro	20
- Getto	5	3	1			1	€ 445,80	1 Betonpompa	5
- Reinterro	2	8	1	1		2	€ 1.000,96	1 Escavatore 1 Pala	4
- Realizzazione canalizzazione in c.c.a.:						0	€ -		0
- Scavo	1	8		1		1	€ 262,72	1 Escavatore	1
- Getto Magrone	2	3	1			1	€ 178,32	1 Betonpompa	2
- Casseratura e armatura	2	8	3		1	4	€ 1.990,24	1 Autocarro	8
- Getto	2	3	1			1	€ 178,32	1 Betonpompa	2
- Reinterro	2	8	1	1		2	€ 1.000,96	1 Escavatore 1 Pala	4
- Opere in ferro	3	8	1		1	2	€ 1.558,80	1 Autocarro	6
- Smantellamento del cantiere	2	8	2		1	3	€ 1.514,72		6
